PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Huellitas: Sistema de Gestión Veterinaria y Guardería Canina

Automatización operativa, blindaje de caja y control estricto de cupo físico

Defensa de Proyecto • MVP 1

Exposición en 3 Bloques

BLOQUE 1 • NEGOCIO Y DIAGNÓSTICO

El Cliente: Operatoria Dual en Crecimiento

Clínica Veterinaria

Consultas, cirugías, vacunación y especialistas externos.

Guardería y Hotel Canino

Estadías diurnas y nocturnas con patio recreativo.

Cuello de botella actual: Gestión exclusiva en planilla Excel.



DOLORES OPERACIONALES CRÍTICOS

Tres Puntos de Fuga en la Operación Diaria

Fuga de Dinero

Señas informales olvidadas.

Saldos deudores sin reclamar.

Sobreventa de Cupo

Guarderia con tope seguro en 10 perros.

Picos de hasta 14 con riesgo físico.

Caos de Registros

Múltiples filas para un mismo dueño.

Historial clínico mezclado con pagos.

PROPUESTA DE VALOR

Impacto Operacional Inmediato

Freno a la Fuga Financiera

Alerta visual de morosos al retirar la mascota en mostrador.

Blindaje Físico de Guardería

Bloqueo automático de reservas al alcanzar el tope de 8 a 10 plazas.

Padrón Único Relacional

Estructura limpia: 1 Dueño, múltiples mascotas y contactos.



BLOQUE 2 • PLANIFICACIÓN GENERAL

Línea de Tiempo Macro: 10 Semanas (5 Sprints)

SPRINT 1 (SEM 1-2)

Padrón y Migración

Limpieza del Excel histórico.

SPRINT 2 (SEM 3-4)

Caja y Cupos

Cobros, señas y tope inicial.

SPRINT 3 (SEM 5-6)

Guardería Full

Agenda a 4 meses y cotizador.

SPRINT 4 (SEM 7-8)

Historia Clínica

Fichas médicas y cirujanos.

SPRINT 5 (SEM 9-10)

Despliegue Final

Puesta en marcha y capacitación.

Hito 1 (Semana 4): MVP Operativo Inicial

Base relacional migrada, cobros en mostrador y bloqueo de patio.

Hito 2 (Semana 10): Entrega y Producción

Historias clínicas, panel del Dueño y personal capacitado.

PRIORIZACIÓN FUNCIONAL

Foco Estratégico: Qué Entra y Qué Queda Fuera

MVP 1: Crítico Operativo

- Padrón unificado (1 dueño N mascotas)
- Cobros, señas variables y deudores
- Cupo estricto guardería (8-10 perros)
- Historia médica separada de caja
- Honorarios a veterinarios externos

Fase Posterior: MVP 2

- Algoritmo de karma y puntualidad
- Notificaciones por WhatsApp
- Portal web de autoservicio

Justificación: Ordenar la base antes de sumar automatizaciones externas.

PROPUESTA COMERCIAL LLAVE EN MANO

Inversión Cerrada y Pagos Vinculados a Hitos

Presupuesto Total Cerrado (MVP 1)

$3.000.000 ARS

Garantía 30 Días Posproducción

Sin costos imprevistos ni horas extra

Validez de **15 días corridos** desde la fecha de presentación

30%

Anticipo Inicial

$900.000 ARS

Firma y limpieza de base.

40%

Hito 1 (Semana 4)

$1.200.000 ARS

Padrón, cobros y cupo inicial.

30%

Hito 2 (Semana 10)

$900.000 ARS

Entrega, clínica y capacitación.

BLOQUE 3 • ARQUITECTURA TÉCNICA

Stack Tecnológico Seleccionado

Python + FastAPI

Validación de datos.

Documentación automática.

SQLite + SQLAlchemy

Relacional.

Transaccional.

Pandas Perfilado

Saneamiento del Excel histórico.

Integridad relacional garantizada.


React + TypeScript

Componentes reutilizables.

Interfaz ágil para mostrador y móvil.

DISEÑO DEL SISTEMA • MÓDULO MOSTRADOR

Búsqueda Ágil y Alerta Visual de Morosos

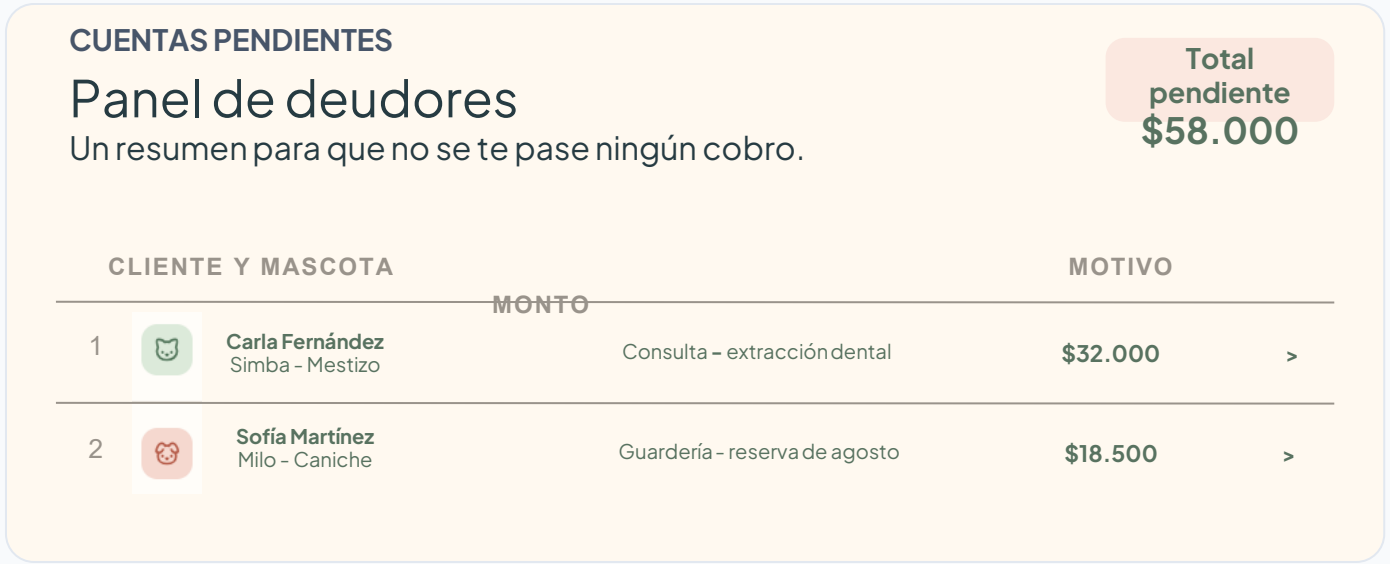

Cero Deudas Involuntarias

Aviso en pantalla antes de restituir al perro.

Conciliación Inmediata

Registro en mostrador de transferencias y señas.

DISEÑO DEL SISTEMA • MATRIZ DE GUARDERÍA

Tope Físico Automatizado: Límite 8 a 10 Perros





Seguridad y Bienestar

Espacio físico controlado sin sobrepoblación.

Datos ordenados y Roles

Panel de rentabilidad privado.


CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

Control Total del Negocio, Seguridad y Escalabilidad

Un producto diseñado para transformar la operatoria diaria desde el comienzo.

¿Preguntas o comentarios?

¡Muchas gracias!

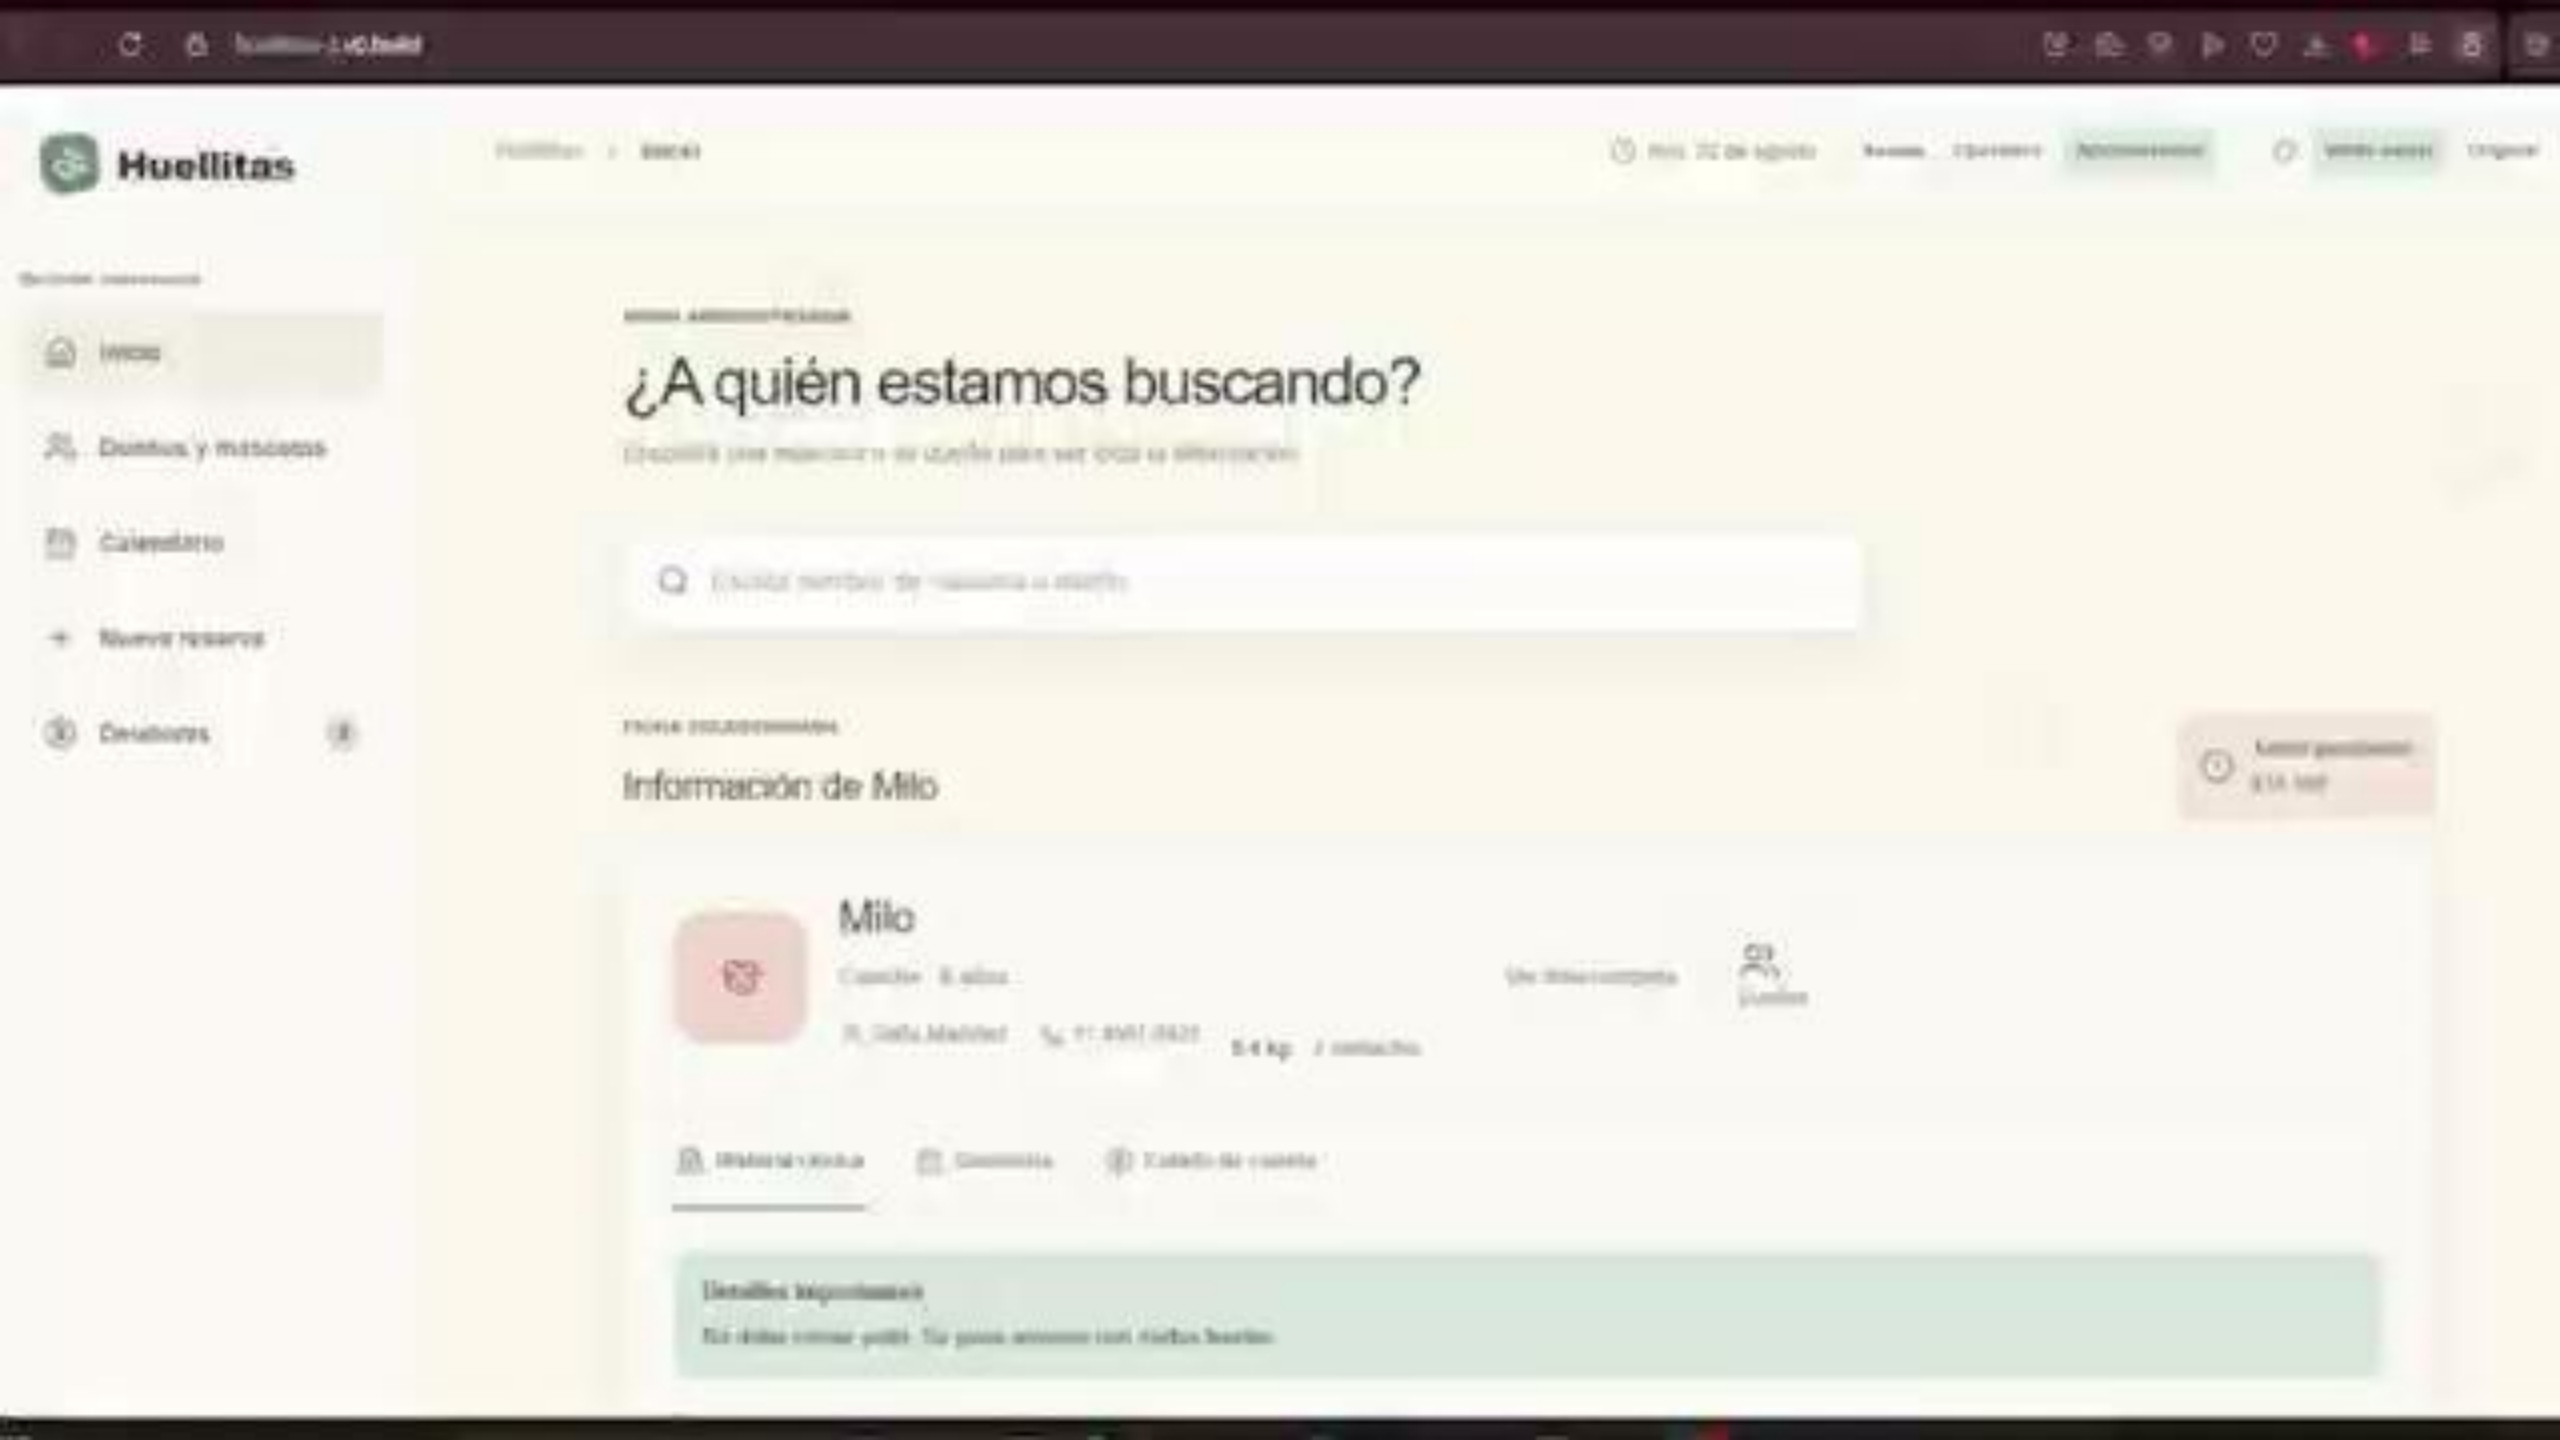
Huellitas
Inicio
Dueños y mascotas
Calendario
Nueva reserva
¿A quién estamos buscando?
Información de Milo
Milo
